


14. 100mm安心プラン

◎事業概要

新方川及び会之堀川流域では、近年頻発する局地的豪雨により、浸水被害が多発しています。そこで、埼玉県と本市、河川事業と下水道事業とが連携し、これらの浸水被害の早期軽減を図るため、平成27年に埼玉県で初めて100ミリアン心プランの登録を受けました。

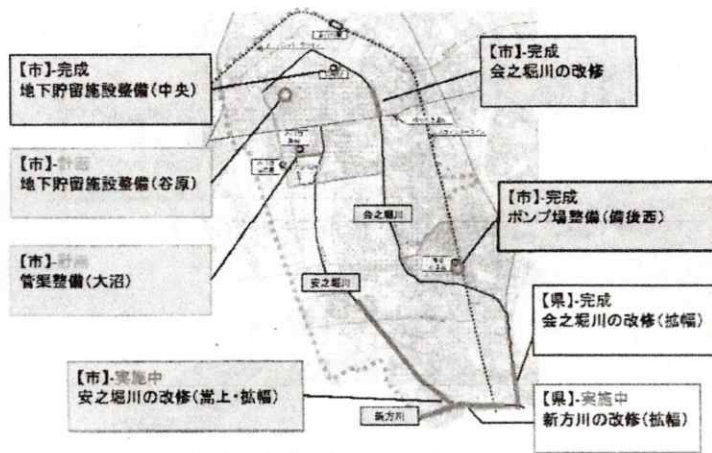

◎主な事業内容

- ・会之堀川の改修（完成）
- ・地下貯留施設 中央地区（完成）
- ・備後西ポンプ場整備（完成）
- ・準用河川安之堀川の改修（実施中）
- ・管渠整備 大沼地区（計画）
- ・地下貯留施設 谷原地区（計画）

《事業進捗度》

事業進捗度は平成31年3月末現在で約49%（事業費ベース）。

《事業スケジュール（予定）》

		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
備後西ポンプ場		[Progress bar from H28 to H29]									
準用河川 安之堀川	用地買収			[Progress bar from H30 to R1]							
	護岸嵩上				[Progress bar from R1 to R2]						
	河道拡幅						[Progress bar from R3 to R4]				
大沼管渠・谷原地下貯留施設									[Progress bar from R5 to R7]		

※令和元・2年度においては、準用河川安之堀川の一部で護岸堤防の嵩上げ工事（下図参照）を実施する予定。

